N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début
0		**STEP CHATEAU**	**3888,28 jrs?**	**Lun 01/04/19**
1		**FONCIER**	**1339,71 jrs?**	**Lun 01/04/19**
2		CONTACT PROPRIETAIRES	30 jrs	Lun 01/04/19
3		ACQUISITION AMIABLE	216 jrs	Sam 25/05/19
4		NEGOCIATION EVICTION EXPLOITANT	219 jrs	Jeu 21/10/21
5		SIGNATURE CONVENTION INDEMNITE EVICTION	1 jr?	Mer 04/05/22
6		REPRISE EFFECTIVE TERRAIN ET BORNAGE PROVISOIRE	1 jr	Jeu 07/07/22
7		**MAITRISE D'OEUVRE**	**1383,14 jrs?**	**Jeu 01/04/21**
8		**MARCHE DE MAITRIS D'OEUVRE**	**275 jrs?**	**Jeu 01/04/21**
9		PROGRAMME	37,29 jrs?	Jeu 01/04/21
10		DCE	43,29 jrs	Mar 04/05/21
11		CONSULTATION	103,57 jrs	Jeu 08/07/21
12		ATRIBUTION	1 jr	Lun 11/10/21
13		ORDRE DE SERVICE DEMARAGE AVP	1 jr?	Mer 01/12/21
14		**AUTORISATION LOI SUR L'EAU ET PC**	**978,14 jrs?**	**Jeu 02/12/21**
15		**ETUDES ENVIRONNEMENTALES**	**543,14 jrs?**	**Jeu 02/12/21**
16		MAPA ETUDES ENVIRONNEMENTALES VOLET 1	90 jrs	Jeu 02/12/21
17		Mesures qualitatives du milieu récepteur	107,14 jrs	Lun 31/01/22
18		Etude de traitabilité des effluents	110 jrs	Jeu 25/08/22
19		**Etude faune flore 4 SAISONS**	**433,14 jrs**	**Jeu 10/03/22**
20		RENDU RAPORT PHASE 1	213,14 jrs	Jeu 10/03/22
21		TRANCHE OPTIONELLE SAISONS AUTOMNE HIVER	220 jrs	Jeu 15/09/22
22		MAPA ETUDES ENVIRONNEMENTALES VOLET 2	90 jrs	Ven 01/07/22
23		Etude environnementale Bruits	60 jrs?	Dim 18/09/22
24		Etude environnementale odeurs	70 jrs	Mar 18/10/22
25		**ARCHEOLOGIE PREVENTIVE**	**90 jrs?**	**Mer 01/03/23**
26		CAMPAGNE DE RECHERCHE	90 jrs?	Mer 01/03/23
27		**PROCEDURE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE**	**156 jrs**	**Mer 30/11/22**
28		DECLARATION D'INTENTION	156 jrs	Mer 30/11/22
29		ENVOI PREFECTURE DECLARATION INTENTION	1 jr	Mer 30/11/22
30		REPONSE PREFECTURE	30 jrs	Jeu 01/12/22
31		PREPARATION AVEC CABINET DE COMMUNICATION	30 jrs	Mar 27/12/22
32		PUBLICITE PREFECTURE CONCERTATION	60 jrs	Mar 27/12/22
33		PERIODE DE CONCERTAION	15 jrs	Lun 27/02/23
34		BILAN DE CONCERTATION	30 jrs	Mer 22/03/23
35		**REDACTION DOSSIER IMPACT**	**65 jrs**	**Jeu 30/03/23**
36		Précadrage et préconsultation	4 sem.	Jeu 30/03/23
37		Rédaction du dossier	6 sem.	Lun 17/04/23
38		Dépôt du dossier	15 jrs	Dim 14/05/23
39		INSTRUCTION PREFECTURE	180 jrs?	Sam 27/05/23
40		ENQUETE PUBLIQUE	100 jrs	Sam 04/11/23
41		DECISION PREFECTORALE	90 jrs	Jeu 01/02/24
42		**PERMIS DE CONSTRUIRE**	**256 jrs**	**Mer 05/04/23**
43		REDACTION DES PIECES	45 jrs	Mer 05/04/23
44		DEPOT	30 jrs	Lun 15/05/23
45		INSTRUCTION	180 jrs	Dim 11/06/23
46		PC	1 jr	Sam 18/11/23
47		**AVANT PROJET STEP**	185,71 jrs	Lun 15/11/21
48		DOSSIER AVP	127,71 jrs	Jeu 02/12/21
49		Phase 1 - mise à jour contraintes/objectifs	4 sem.	Lun 15/11/21
50		Phase 1 - étude hydrogéologique (CPGF)	4 sem.	Lun 22/11/21
51		Phase 2 - développement de la solution	6 sem.	Lun 10/01/22
52		Phase 2 - Intégration G2AVP	2 sem.	Lun 21/02/22
53		Validation STEASA	2 sem.	Lun 07/03/22
54		VALIDATION AVP PAR OS	1 jr	Ven 29/04/22
55		**PROJET STEP**	207 jrs?	Jeu 01/12/22
56		DOSSIER PRO	137 jrs?	Jeu 01/12/22
57		Validation STEASA	2 sem.	Dim 02/04/23
58		DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION	60 jrs	Lun 10/04/23
59		**DCE STEP**	120 jrs	Mar 30/04/24
60		DOSSIER DCE	120 jrs	Mar 30/04/24
61		**ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES**	**2811,85 jrs**	**Lun 15/11/21**
62		**ETUDE DE SOL**	**507,29 jrs**	**Lun 15/11/21**
63		DCE ETUDE DE SOL	44,29 jrs	Lun 15/11/21
64		CONSULTATION GEOTECHNIQUES MAPA	66,71 jrs	Sam 25/12/21
65		ETUDE DE SOL G2AVP + POLLUTION DES SOLS	100,71 jrs	Lun 23/05/22
66		ETUDE DE SOL G2 PRO	60 jrs	Dim 18/12/22
67		**ETUDE HYDROGEOLOGUE**	**191,14 jrs**	**Jeu 01/09/22**
68		DCE HYDROGEOLOGIE	41,29 jrs	Jeu 01/09/22
69		CONSULTATION	60 jrs	Sam 08/10/22
70		ETUDE HYDROGEOLOGIE	90 jrs	Mer 30/11/22
71		**DIAG AMIANTE ANCIENNE STEP**	**97,57 jrs**	**Dim 01/05/22**
72		CONSULTATION DIAG AMIANTE	36,71 jrs	Dim 01/05/22
73		DIAG AMIANTE HAP	60 jrs	Ven 03/06/22
74		**CONTRÔLE TECHNIQUE**	**2258,71 jrs**	**Lun 15/11/21**
75		MAPA CT ELABORATION	44,29 jrs	Lun 15/11/21
76		MAPA CT CONSULTATION	116 jrs	Sam 01/01/22
77		MAPA CT ATTRIBUTION	1 jr	Mer 11/05/22
78		MISSION CT	1 jr	Mer 19/05/27
79		**SPS**	**2811,85 jrs**	**Lun 15/11/21**
80		MAPA SPS ELABORATION	44,29 jrs	Lun 15/11/21
81		MAPA SPS CONSULTATION	30 jrs	Dim 09/01/22
82		MAPA SPS ATTRIBUTION	1 jr	Ven 18/02/22
83		SPS CONCEPTION	60 jrs	Mer 15/06/22
84		SPS REALISATION	1400 jrs	Sam 26/04/25
85		**CONTRÔLE DE PERFORMANCES**	**970 jrs**	**Jeu 30/10/25**
86		MAPA CP ELABORATION	30 jrs	Jeu 30/10/25
87		MAPA CP CONSULTATION	30 jrs	Mar 25/11/25
88		MAPA CP ATTRIBUTION	30 jrs	Lun 22/12/25
89		CONTRÔLE PERFORMANCES REALISATION	60 jrs	Mar 18/01/28
90		**PREPARATION A L'EXPLOITATION**	**1212,86 jrs?**	**Mar 30/04/24**
95		**TRAVAUX**	**1425 jrs?**	**Mar 10/09/24**
96		**CONSULTATION TRAVAUX STEP**	**255 jrs?**	**Mar 10/09/24**
97		CONSULTATION TRAVAUX	120 jrs?	Mar 10/09/24
98		ANALYSE DES OFFRES	60 jrs	Jeu 26/12/24
99		ATTRIBUTION COMMISSION APPEL D'OFFRES	45 jrs	Mar 18/02/25
100		NOTIFICATION MARCHE	30 jrs	Dim 30/03/25
101		**TRAVAUX STEP**	**1170 jrs**	**Sam 26/04/25**
102		PERIODE DE PREPARATION	120 jrs	Sam 26/04/25
103		TRAVAUX	900 jrs	Dim 10/08/25
104		MISE SOUS TENSION ELECTRIQUE	30 jrs	Sam 25/09/27
105		PERIODE DE MISE EN REGIME	60 jrs	Jeu 21/10/27
106		CAC	20 jrs	Mar 14/12/27
107		PERIODE DE MISE EN OBSERVATION	60 jrs	Sam 01/01/28
108		RECEPTION	10 jrs	Mer 23/02/28
109		TRAVAUX BASSINS INFILTRATION	180 jrs	Jeu 30/03/28
110		DEMOLITION ANCIENNE STATION	120 jrs	Lun 22/05/28
111		**TRAVAUX ANNEXES**	**920 jrs**	**Dim 10/08/25**
112		**RACCORDEMENT ELECTRIQUE**	120 jrs	Sam 24/07/27
113		**RACCORDEMENT EAU POTABLE**	**90 jrs**	**Dim 10/08/25**

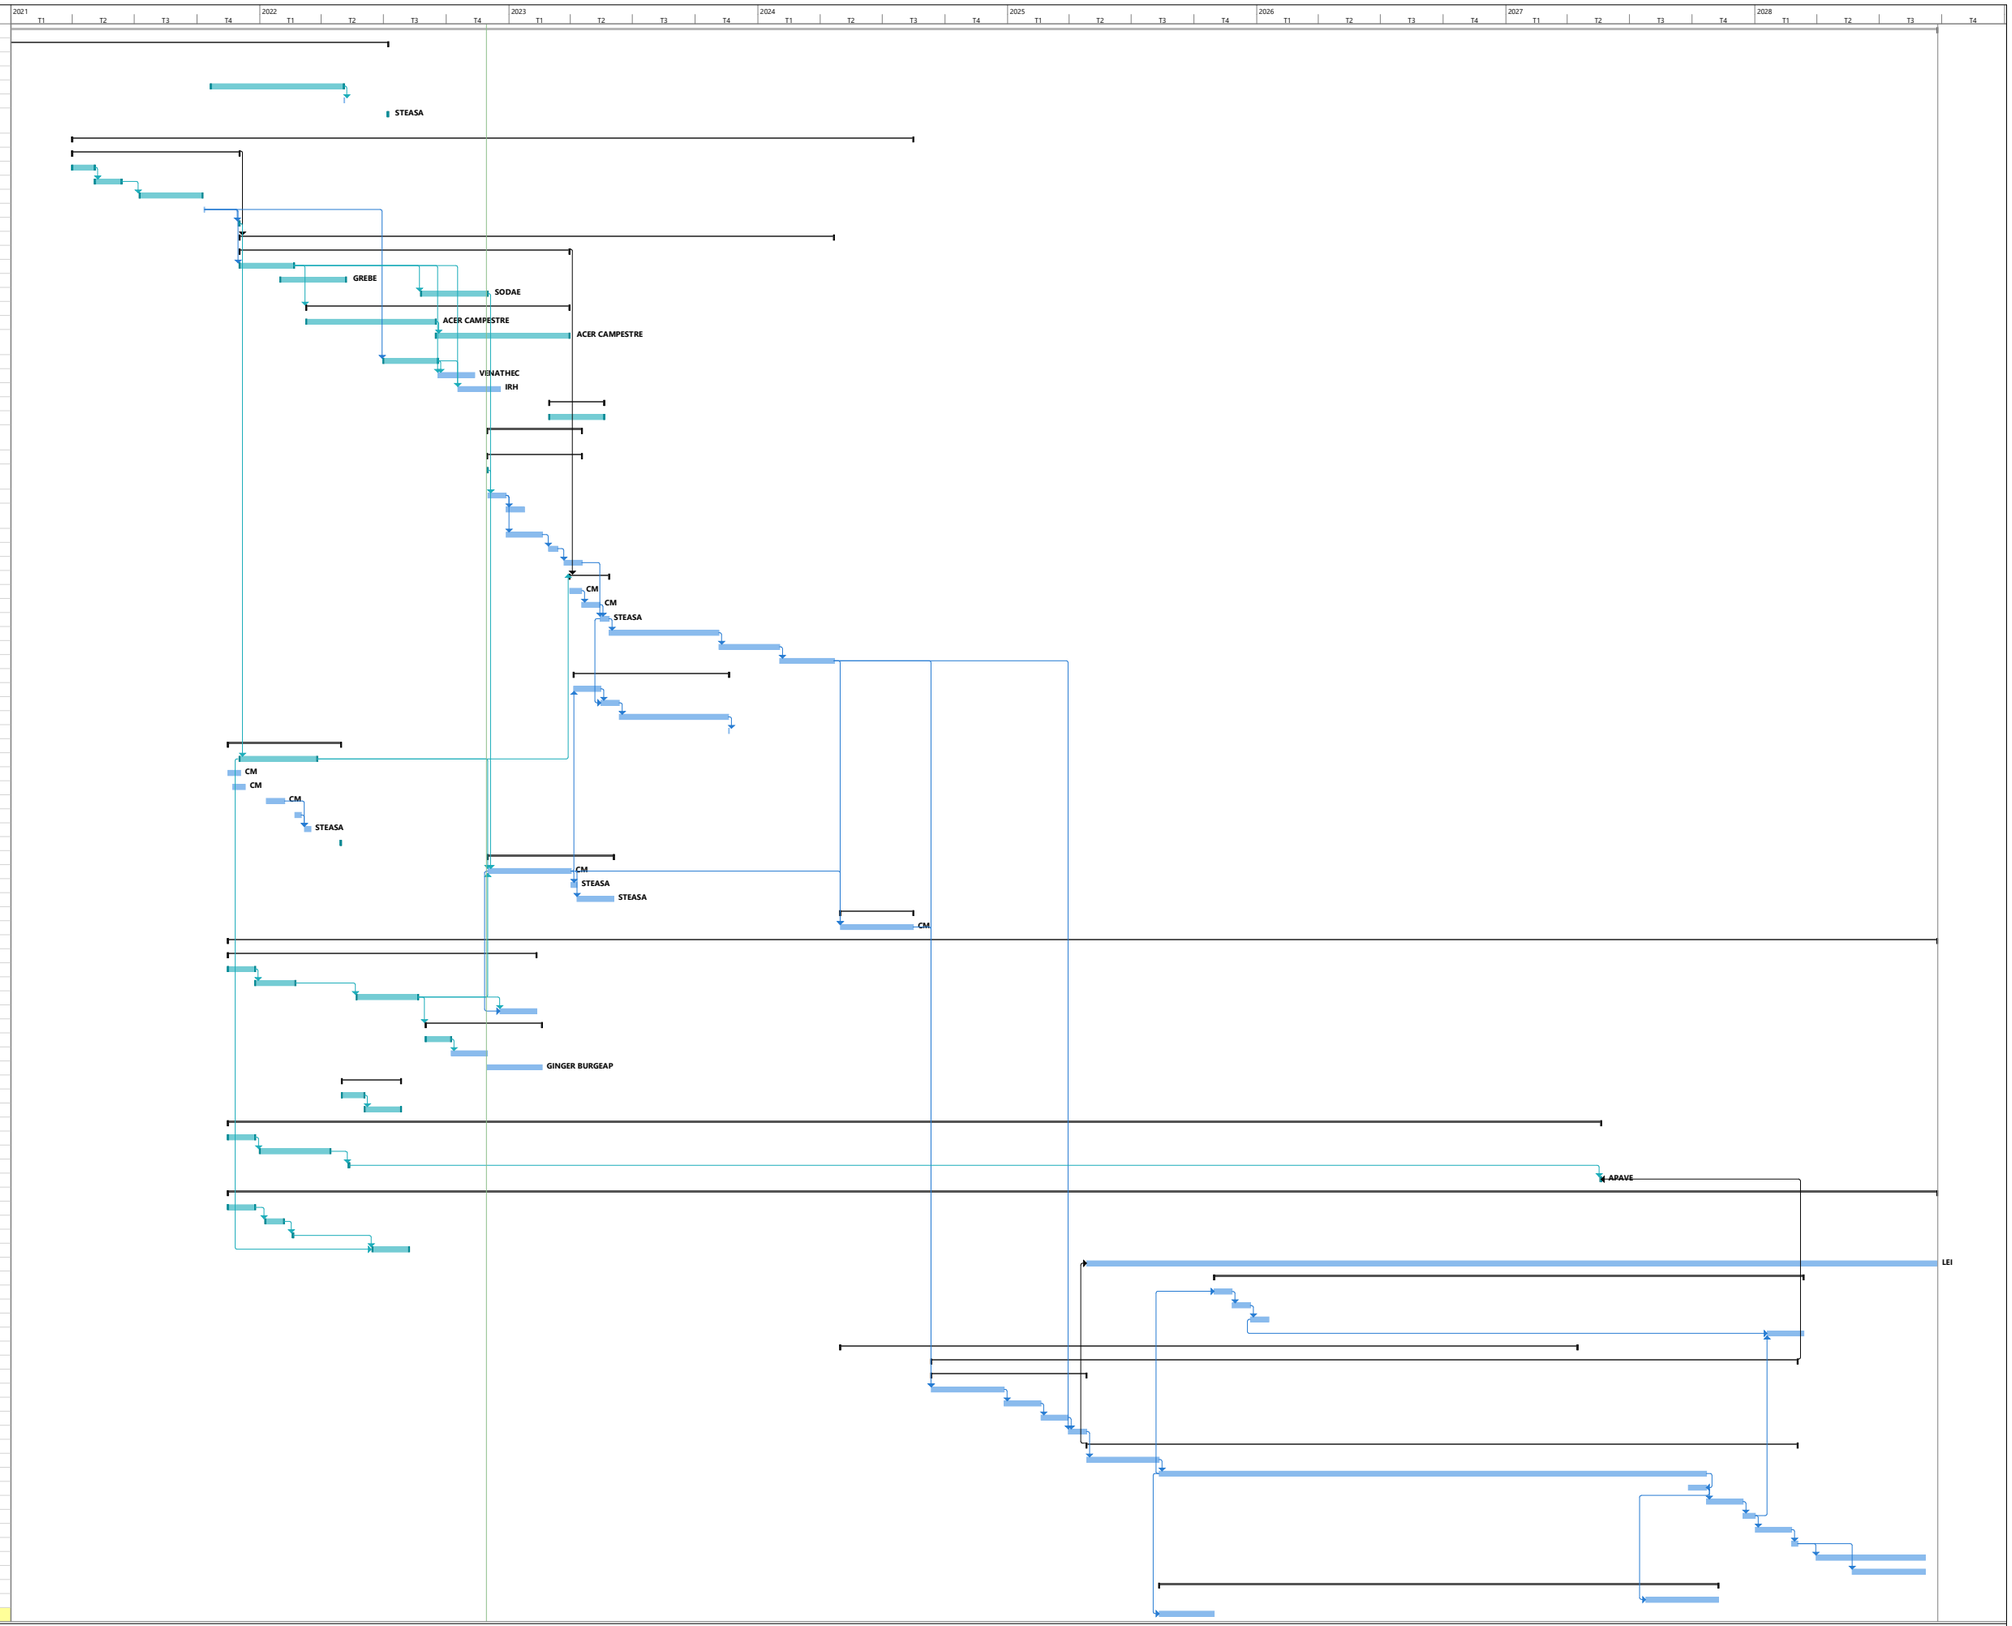

Projet : STEP CHATEAU
Date : Mar 29/11/22

Tâche | Fractionnement | Jalon | Récapitulative | Récapitulatif du projet | Tâche inactive | Jalon inactif | Récapitulatif inactif | Tâche manuelle | Durée uniquement | Report récapitulatif manuel | Récapitulatif manuel | Début uniquement | Fin uniquement | Tâches externes | Jalons externes | Échéance | Avancement | Progression manuelle
